
















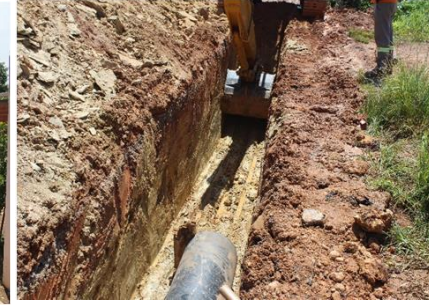


SAA	Item	Serviço	Prazo	Status	 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO / ADITAMENTO AO TAC INVESTIMENTOS PÓS RETOMADA - PLANO EMERGENCIAL (REGISTRO FOTOGRÁFICO) SISTEMA SUL		
Sistema Sul	a)	Captação para 750 l/s	22 meses (junho 2019)	Obra não iniciada			
	b)	Adução para a Captação para a ETA ETA Ø= 900 mm (ferro fundido)	22 meses (junho 2019)	Obra não iniciada			
	c)	ETA para 750 l/s	22 meses (junho 2019)	ETA em fase de fabricação	   	 <p>ARSEC AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ</p>	
	d)	Reservatório da ETA	24 meses (agosto 2019)	Obra não iniciada			
	e)	Adução ETA para reservatório Santa Terezinha Ø= 600 mm (ferro fundido)	22 meses (junho 2019)	Em andamento	     	<p>1. RF 319/2018 (10/2018)</p> <p>2. RF 353/2018 (10/2018)</p> <p>3. RF 356/2018 (10/2018)</p>      	
	f)	Reservatório Santa Terezinha	22 meses (junho 2019)	Obra não iniciada			
